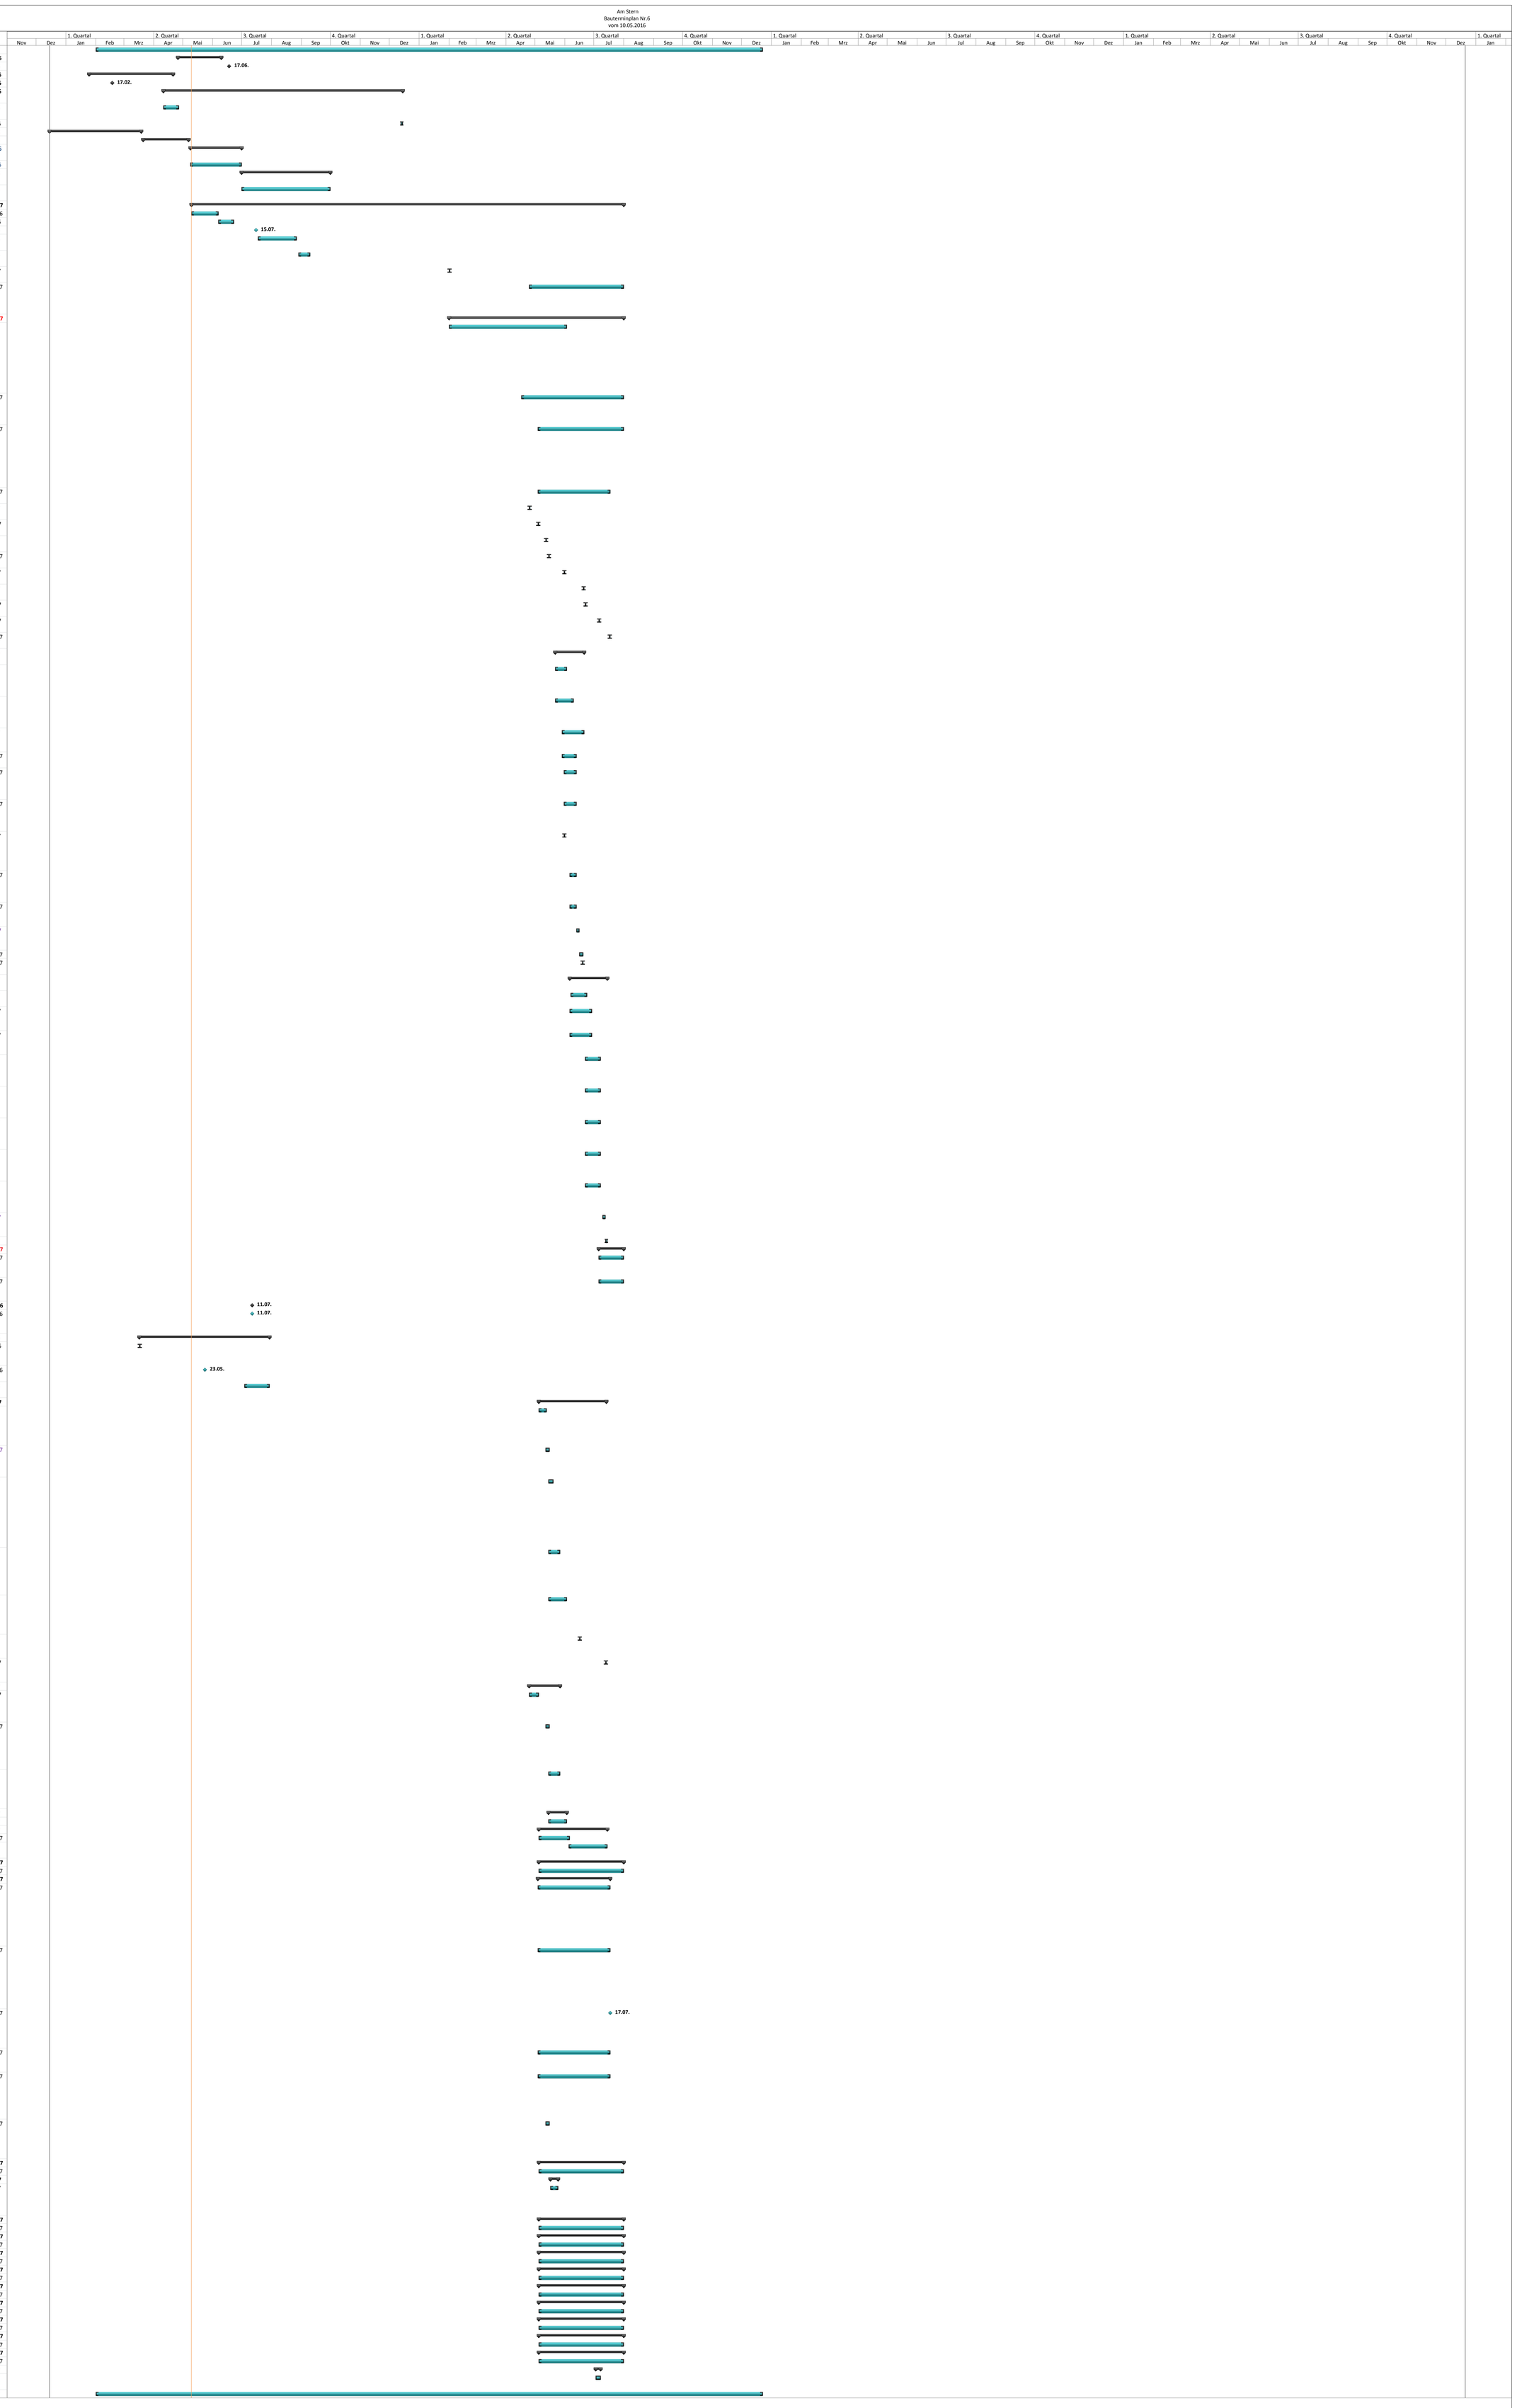Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1	Projektbeginn	492 Tage	Mo 01.02.16	Fr 22.12.17
2	**Deputation**	**32 Tage**	**Mo 25.04.16**	**Do 09.06.16**
5	**Mittelbereitstellung**	**0 Tage**	**Fr 17.06.16**	**Fr 17.06.16**
7	**Verkehrskoordination**	**61 Tage**	**Mo 25.01.16**	**Mi 20.04.16**
13	**Leitungskoordination**	**0 Tage**	**Mi 17.02.16**	**Mi 17.02.16**
15	**Befreiungsantrag Bäume/Rodungsarbeiten**	**177 Tage**	**Mo 11.04.16**	**Mi 14.12.16**
16	Befreiungsantrag Bäume einschl. Genehmigung	12 Tage	Mo 11.04.16	Di 26.04.16
17	Rodungsarbeiten Bäume im Kreis	2 Tage	Di 13.12.16	Mi 14.12.16
18	**TöB (20-10)**	**69 Tage**	**Di 15.12.15**	**Fr 18.03.16**
23	Ausführungsplanungen (20-10)	33 Tage	Mo 21.03.16	Fr 06.05.16
31	**Betriebsplan erstellen (32-8 bzw. 32-9)**	**38 Tage**	**Mo 09.05.16**	**Do 30.06.16**
32	Betriebsplan erstellen	38 Tage	Mo 09.05.16	Do 30.06.16
33	**Betriebsplan abstimmen/genehmigen (30-5)**	**66 Tage**	**Fr 01.07.16**	**Fr 30.09.16**
34	Betriebsplan abstimmen/genehmigen	66 Tage	Fr 01.07.16	Fr 30.09.16
35	**Ing.-Büro Straßenbau**	**319 Tage**	**Di 10.05.16**	**Mo 31.07.17**
36	Ing.-Büro auffordern	19 Tage	Di 10.05.16	Mo 06.06.16
37	Ing.-Büro Prüfung der Angebote	12 Tage	Di 07.06.16	Mi 22.06.16
38	Ing.-Büro Auftragserteilung	0 Tage	Fr 15.07.16	Fr 15.07.16
39	Ing.-Büro Ausschreibung Erstversion	30 Tage	Mo 18.07.16	Fr 26.08.16
40	Ing.-Büro Ausschreibung Endversion	10 Tage	Mo 29.08.16	Fr 09.09.16
41	Ing.-Büro Anlaufbesprechung mit allen Beteiligten	1 Tag	Mi 01.02.17	Mi 01.02.17
42	Ing.-Büro Koordination BSAG und Bauüberwachung Straßenbauarbeiten, einschl. Abnahme	70 Tage	Di 25.04.17	Mo 31.07.17
43	**Straßenbauarbeiten Absperrung**	**129 Tage**	**Mi 01.02.17**	**Mo 31.07.17**
44	Der AN Straßenbau organisiert (auch für die BSAG Fahrleitung und BSAG Gleisbau) und stellt die Verkehrsanordnungen sowie die komplette Verkehrsicherung. Der AN Straßenbau ist somit verantwortlich für die komplette Verkehrssicherung der Drittgewerke	88 Tage	Mi 01.02.17	Fr 02.06.17
45	Aufstellen, umstellen und vorhalten der äußeren Absperrung nach Verkehrssicherungsabschnitten	76 Tage	Mo 17.04.17	Mo 31.07.17
46	Aufstellen, umstellen und vorhalten der inneren Absperrung am 04.05.2017 ab 09:00 Uhr(Verkehrssicherungsabschnitte 1), einschl. Gleisschranken. Nach den vorgegebenen einzelnen Verkehrssicherungsabschnitten	63 Tage	Do 04.05.17	Mo 31.07.17
47	Prov. Signalanlagen der Furten aufstellen und vorhalten	53 Tage	Do 04.05.17	Mo 17.07.17
48	Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 0 BSAG Fahrleitung einrichten	1 Tag	Di 25.04.17	Di 25.04.17
49	Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 1 BSAG Gleisbau einrichten	1 Tag	Do 04.05.17	Do 04.05.17
50	Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 2 BSAG Gleisbau einrichten	1 Tag	Fr 12.05.17	Fr 12.05.17
51	Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 3 BSAG Gleisbau einrichten	1 Tag	Mo 15.05.17	Mo 15.05.17
52	Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 4 einrichten	1 Tag	Mi 31.05.17	Mi 31.05.17
53	Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 5 einrichten	1 Tag	Di 20.06.17	Di 20.06.17
54	Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 6 einrichten	1 Tag	Do 22.06.17	Do 22.06.17
55	Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 7 einrichten	1 Tag	Do 06.07.17	Do 06.07.17
56	Rückbau der Verkehrssicherung Am Stern	1 Tag	Mo 17.07.17	Mo 17.07.17
57	**Straßenbauarbeiten Am Stern Süd**	**22 Tage**	**Mo 22.05.17**	**Di 20.06.17**
58	Straßenbauarbeiten Hermann-Böse Straße einschl. Nebenflächen und Mittelinsel stadtauswärts	10 Tage	Mo 22.05.17	Fr 02.06.17
59	Straßenbauarbeiten Parkallee (West) einschl. Nebenflächen und halber Mittelinsel stadteinwärts	15 Tage	Mo 22.05.17	Fr 09.06.17
60	Straßenbauarbeiten Hollerallee (Süd) einschl. Nebenflächen und halber Mittelinsel stadteinwärts	17 Tage	Mo 29.05.17	Di 20.06.17
61	Straßenbauarbeiten am Innenring Südseite	11 Tage	Mo 29.05.17	Mo 12.06.17
62	Straßenbauarbeiten Parkallee (West) einschl. Nebenflächen und halber Mittelinsel stadtauswärts. Abschnitt 4	9 Tage	Mi 31.05.17	Mo 12.06.17
63	Straßenbauarbeiten Hollerallee (Süd) einschl. Nebenflächen und halber Mittelinsel stadtauswärts. Abschnitt 4	9 Tage	Mi 31.05.17	Mo 12.06.17
64	Wender(Asphalt) in die Parkallee (West) über die Fahrbahnen, auf den Grünstreifen zwischen den Bäumen vor der Arbeitsstelle, herstellen	1 Tag	Mi 31.05.17	Mi 31.05.17
65	Straßenbauarbeiten Wachmannstraße einschl. Nebenflächen und halber Mittelinsel stadtauswärts	5 Tage	Di 06.06.17	Mo 12.06.17
66	Straßenbauarbeiten Inselherstellung vor der Wachmannstraße	5 Tage	Di 06.06.17	Mo 12.06.17
67	Asphalteinbau Am Stern einschl. der Anschlussflächen der Nebenstraße. (Südseite)	3 Tage	Di 13.06.17	Do 15.06.17
68	Markierung (Südseite)	2 Tage	Fr 16.06.17	Mo 19.06.17
69	Wender in der Parkallee (West) entfernen	1 Tag	Mo 19.06.17	Mo 19.06.17
70	**Straßenbauarbeiten Am Stern Nord**	**29 Tage**	**Di 06.06.17**	**Fr 14.07.17**
71	Straßenbauarbeiten am Innenring Nordseite	13 Tage	Mi 07.06.17	Fr 23.06.17
72	Straßenbauarbeiten Wachmannstraße einschl. Nebenflächen stadteinwärts	17 Tage	Di 06.06.17	Mi 28.06.17
73	Straßenbauarbeiten Parkallee (Ost) einschl. Nebenflächen rechts stadtauswärts	17 Tage	Di 06.06.17	Mi 28.06.17
74	Straßenbauarbeiten Hermann-Böse Straße einschl. Nebenflächen und Mittelinsel stadteinwärts. Abschnitt 6	12 Tage	Do 22.06.17	Fr 07.07.17
75	Straßenbauarbeiten Inselherstellung vor der Hermann-Böse Straße. Abschnitt 6	12 Tage	Do 22.06.17	Fr 07.07.17
76	Straßenbauarbeiten Hollerallee (Nord) einschl. Nebenflächen und halber Mittelinsel stadtauswärts. Abschnitt 6	12 Tage	Do 22.06.17	Fr 07.07.17
77	Straßenbauarbeiten Hollerallee (Nord) einschl. Nebenflächen und halber Mittelinsel stadteinwärts. Abschnitt 6	12 Tage	Do 22.06.17	Fr 07.07.17
78	Straßenbauarbeiten Parkallee (Ost) einschl. Nebenflächen und ganzer Mittelinsel stadteinwärts. Abschnitt 6	12 Tage	Do 22.06.17	Fr 07.07.17
79	Asphalteinbau Am Stern einschl. der Anschlussflächen der Nebenstraße. (Nordseite)	3 Tage	Mo 10.07.17	Mi 12.07.17
80	Markierung (Südseite)	2 Tage	Do 13.07.17	Fr 14.07.17
81	**Nebenflächen Parkallee (West)**	**18 Tage**	**Do 06.07.17**	**Mo 31.07.17**
82	Straßenbauarbeiten Parkallee (West) stadteinwärts, Gehweg bis Einmündung Parkstraße	18 Tage	Do 06.07.17	Mo 31.07.17
83	Straßenbauarbeiten Parkallee (West) stadtauswärts, Gehweg ab Einmündung Parkstraße	18 Tage	Do 06.07.17	Mo 31.07.17
84	**BSAG Mittel**	**0 Tage**	**Mo 11.07.16**	**Mo 11.07.16**
85	Mittelbereitstellung oder Mittelzusage der BSAG für den Gleisersatzbau der BSAG in 2017	0 Tage	Mo 11.07.16	Mo 11.07.16
86	**BSAG Planung**	**94 Tage**	**Do 17.03.16**	**Fr 29.07.16**
87	Planung ASV zur weiteren Bearbeitung an die BSAG übergeben	1 Tag	Do 17.03.16	Do 17.03.16
88	Planung BSAG zur Einarbeitung in Planung an das ASV übergeben	0 Tage	Mo 23.05.16	Mo 23.05.16
89	Genehmigung gemäß PBefG für den Gleisersatzbau einzuholen	20 Tage	Mo 04.07.16	Fr 29.07.16
90	**BSAG Gleisbau**	**50 Tage**	**Fr 05.05.17**	**Do 13.07.17**
91	Gleisersatzbau Am Stern einschl. Übergang Hermann-Böse Straße bis einschl. Haltestelle Wachmannstraße. Vorbereitende Arbeiten	6 Tage	Fr 05.05.17	Fr 12.05.17
92	Gleisersatzbau Am Stern. Umbauwochenende von Freitag ab 18:00 Uhr bis Montag um 04:00 Uhr	2 Tage	Fr 12.05.17	Mo 15.05.17
93	Übergang Hermann-Böse Straße bis einschl. Gleis in der Fahrbahn. Fertigstellen der Gleisoberfläche. Anschließend übernimmt der Straßenbau diesen Bereich. Baustelleneinrichtungsflächen in den Bereich Parkallee (Ost) zurückziehen	5 Tage	Mo 15.05.17	Fr 19.05.17
94	Innenring einschl. Fahrbahnübergang Wachmannstraße. Fertigstellen der Gleisoberfläche einschl. Rückbau der angelegten Baustraßen	10 Tage	Mo 15.05.17	Fr 26.05.17
95	Fertigstellen des Haltstellenbereiches einschl. neuer Haltstellenpflasterung einschl. Räumung der Arbeitsstelle	15 Tage	Mo 15.05.17	Fr 02.06.17
96	Fuge am Hosenträger nach Einbau der Deckschicht herstellen (Südseite)	1 Tag	Fr 16.06.17	Fr 16.06.17
97	Fuge am Hosenträger nach Einbau der Deckschicht herstellen (Nordseite)	1 Tag	Do 13.07.17	Do 13.07.17
98	**BSAG Fahrleitungsbau**	**24 Tage**	**Di 25.04.17**	**Fr 26.05.17**
99	Fahrleitungsmast in der Wachmannstraße 1 b stadtauswärts neu stellen einschl. Gründungsarbeiten	8 Tage	Di 25.04.17	Do 04.05.17
100	Fahrleitungsmast in der Wachmannstraße 1 b stadtauswärts. Fahrleitung auf neuen Fahrleitungsmast umbauen, während des Umbauwochenendes	2 Tage	Fr 12.05.17	Mo 15.05.17
101	Fahrleitungsmast in der Wachmannstraße 1 b stadtauswärts alt entfernen, einschl. Pflasterung in den Nebenflächen	10 Tage	Mo 15.05.17	Fr 26.05.17
102	**BSAG Fahrgastunterstände**	**15 Tage**	**Mo 15.05.17**	**Fr 02.06.17**
103	Neue Fahrleitungshäuschen	15 Tage	Mo 15.05.17	Fr 02.06.17
104	**BSAG Betrieb**	**51 Tage**	**Fr 05.05.17**	**Fr 14.07.17**
105	Gleistrasse für Busse gesperrt	22 Tage	Fr 05.05.17	Mo 05.06.17
106	Gleistrasse wieder für Busse befahrbar	30 Tage	Mo 05.06.17	Fr 14.07.17
107	**hanseWasser**	**62 Tage**	**Fr 05.05.17**	**Mo 31.07.17**
108	Keine Arbeiten	62 Tage	Fr 05.05.17	Mo 31.07.17
109	**Lichtsignalanlagen**	**53 Tage**	**Do 04.05.17**	**Mo 17.07.17**
110	LSA Wachmannstraße/Am Stern: Ab- und Aufbau der LSA, einschl. Provisorien auf Poller. Schleifeneinbau in der Binderschicht einschl. Leerrohrverlegung in den Nebenflächen. Mit Kopflöchern für Anschlussarbeiten	53 Tage	Do 04.05.17	Mo 17.07.17
111	LSA Hermann-Böse Straße/Am Stern: Ab- und Aufbau der LSA, einschl. Provisorien auf Poller. Schleifeneinbau in der Binderschicht einschl. Leerrohrverlegung in den Nebenflächen. Mit Kopflöchern für Anschlussarbeiten	53 Tage	Do 04.05.17	Mo 17.07.17
112	LSA Hollerallee (Süd) neu, einschl. Anforderungssschleife und Leerrohrverlegung in den Nebenflächen. Mit Kopflöchern in den Nebenflächen	0 Tage	Mo 17.07.17	Mo 17.07.17
113	LSA am Innenkreis vor Gleistrasse versetzen. 2 Stück Signalgeber einschl. Mast.	53 Tage	Do 04.05.17	Mo 17.07.17
114	4 Stück Schachtsystem am Innenkreis neben der Gleistrasse im Bereich der neuen Bordsteinführung zurückbauen und neu setzen. Einschl Kabelverlegung	53 Tage	Do 04.05.17	Mo 17.07.17
115	2 x 4 Stück Leerrohre unter der Gleistrasse im Bereich des neuen Schachtsystem am Innenkreis verlegen. Vor Einbau der Tragschicht in der Gleistrasse	2 Tage	Fr 12.05.17	Mo 15.05.17
116	**Öffentliche Beleuchtung (40-2)**	**62 Tage**	**Fr 05.05.17**	**Mo 31.07.17**
117	Keine Arbeiten	62 Tage	Fr 05.05.17	Mo 31.07.17
118	**swb Beleuchtung**	**6 Tage**	**Mi 17.05.17**	**Mi 24.05.17**
119	Mittelinsel Parkallee (West) PILS-Schild Vorwegweiser der BrePark versetzen, einschl Kabelverlegung	6 Tage	Mi 17.05.17	Mi 24.05.17
120	**wesernetze Bremen**	**62 Tage**	**Fr 05.05.17**	**Mo 31.07.17**
121	Keine Arbeiten	62 Tage	Fr 05.05.17	Mo 31.07.17
122	**Deutsche Telekom Technik**	**62 Tage**	**Fr 05.05.17**	**Mo 31.07.17**
123	Keine Arbeiten	62 Tage	Fr 05.05.17	Mo 31.07.17
124	**vodafon Kabel Deutschland**	**62 Tage**	**Fr 05.05.17**	**Mo 31.07.17**
125	Keine Arbeiten	62 Tage	Fr 05.05.17	Mo 31.07.17
126	**EWE**	**62 Tage**	**Fr 05.05.17**	**Mo 31.07.17**
127	Keine Arbeiten	62 Tage	Fr 05.05.17	Mo 31.07.17
128	**ImmoMediaNet**	**62 Tage**	**Fr 05.05.17**	**Mo 31.07.17**
129	Keine Arbeiten	62 Tage	Fr 05.05.17	Mo 31.07.17
130	**Telekom Deutschland GmbH**	**62 Tage**	**Fr 05.05.17**	**Mo 31.07.17**
131	Keine Arbeiten	62 Tage	Fr 05.05.17	Mo 31.07.17
132	**Ströer Deutsche Städtemedien**	**62 Tage**	**Fr 05.05.17**	**Mo 31.07.17**
133	Keine Arbeiten	62 Tage	Fr 05.05.17	Mo 31.07.17
134	**BrePark**	**62 Tage**	**Fr 05.05.17**	**Mo 31.07.17**
135	Keine Arbeiten	62 Tage	Fr 05.05.17	Mo 31.07.17
136	**Telekabel Bremen**	**62 Tage**	**Fr 05.05.17**	**Mo 31.07.17**
137	Keine Leitungen vorhanden	62 Tage	Fr 05.05.17	Mo 31.07.17
138	**Umweltbetrieb Bremen**	**5 Tage**	**Mo 03.07.17**	**Fr 07.07.17**
139	Bepflanzung Innenring, hinter der Bordanlage	5 Tage	Mo 03.07.17	Fr 07.07.17
140	Projektende	492 Tage	Mo 01.02.16	Fr 22.12.17
